

वार्षिक प्रगति समिक्षा

आ.व. २०७६।०७७



पूर्वाधार विकास तथा योजना शाखा

प्रस्तुतकर्ता

विनोद बाबु खकुराल
ईन्जिनियर

LOCATION MAP


Map Showing States and Districts of Nepal

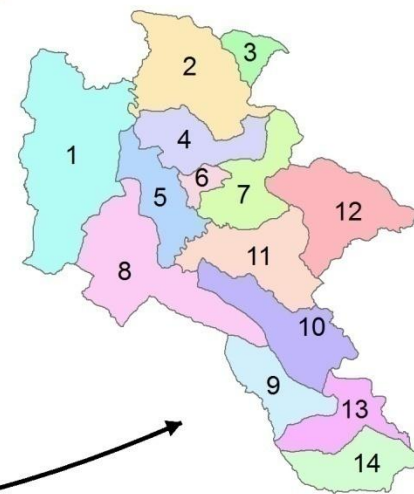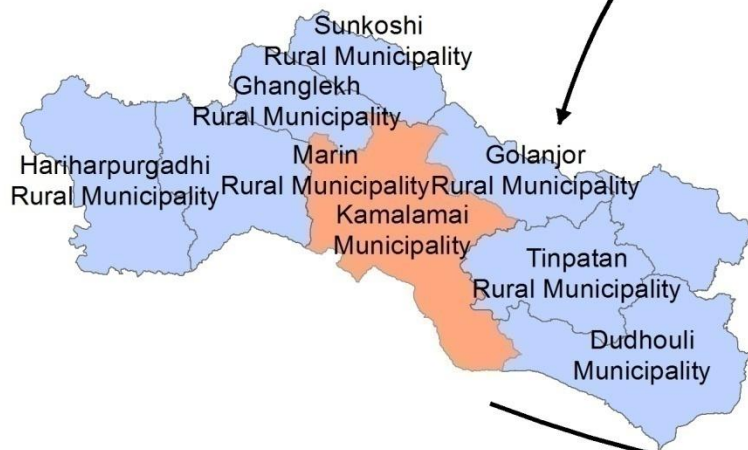

Map of Sindhuli District With its Rural Municipalities/Municipalities

Wards of Kamalamai Municipality

कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली

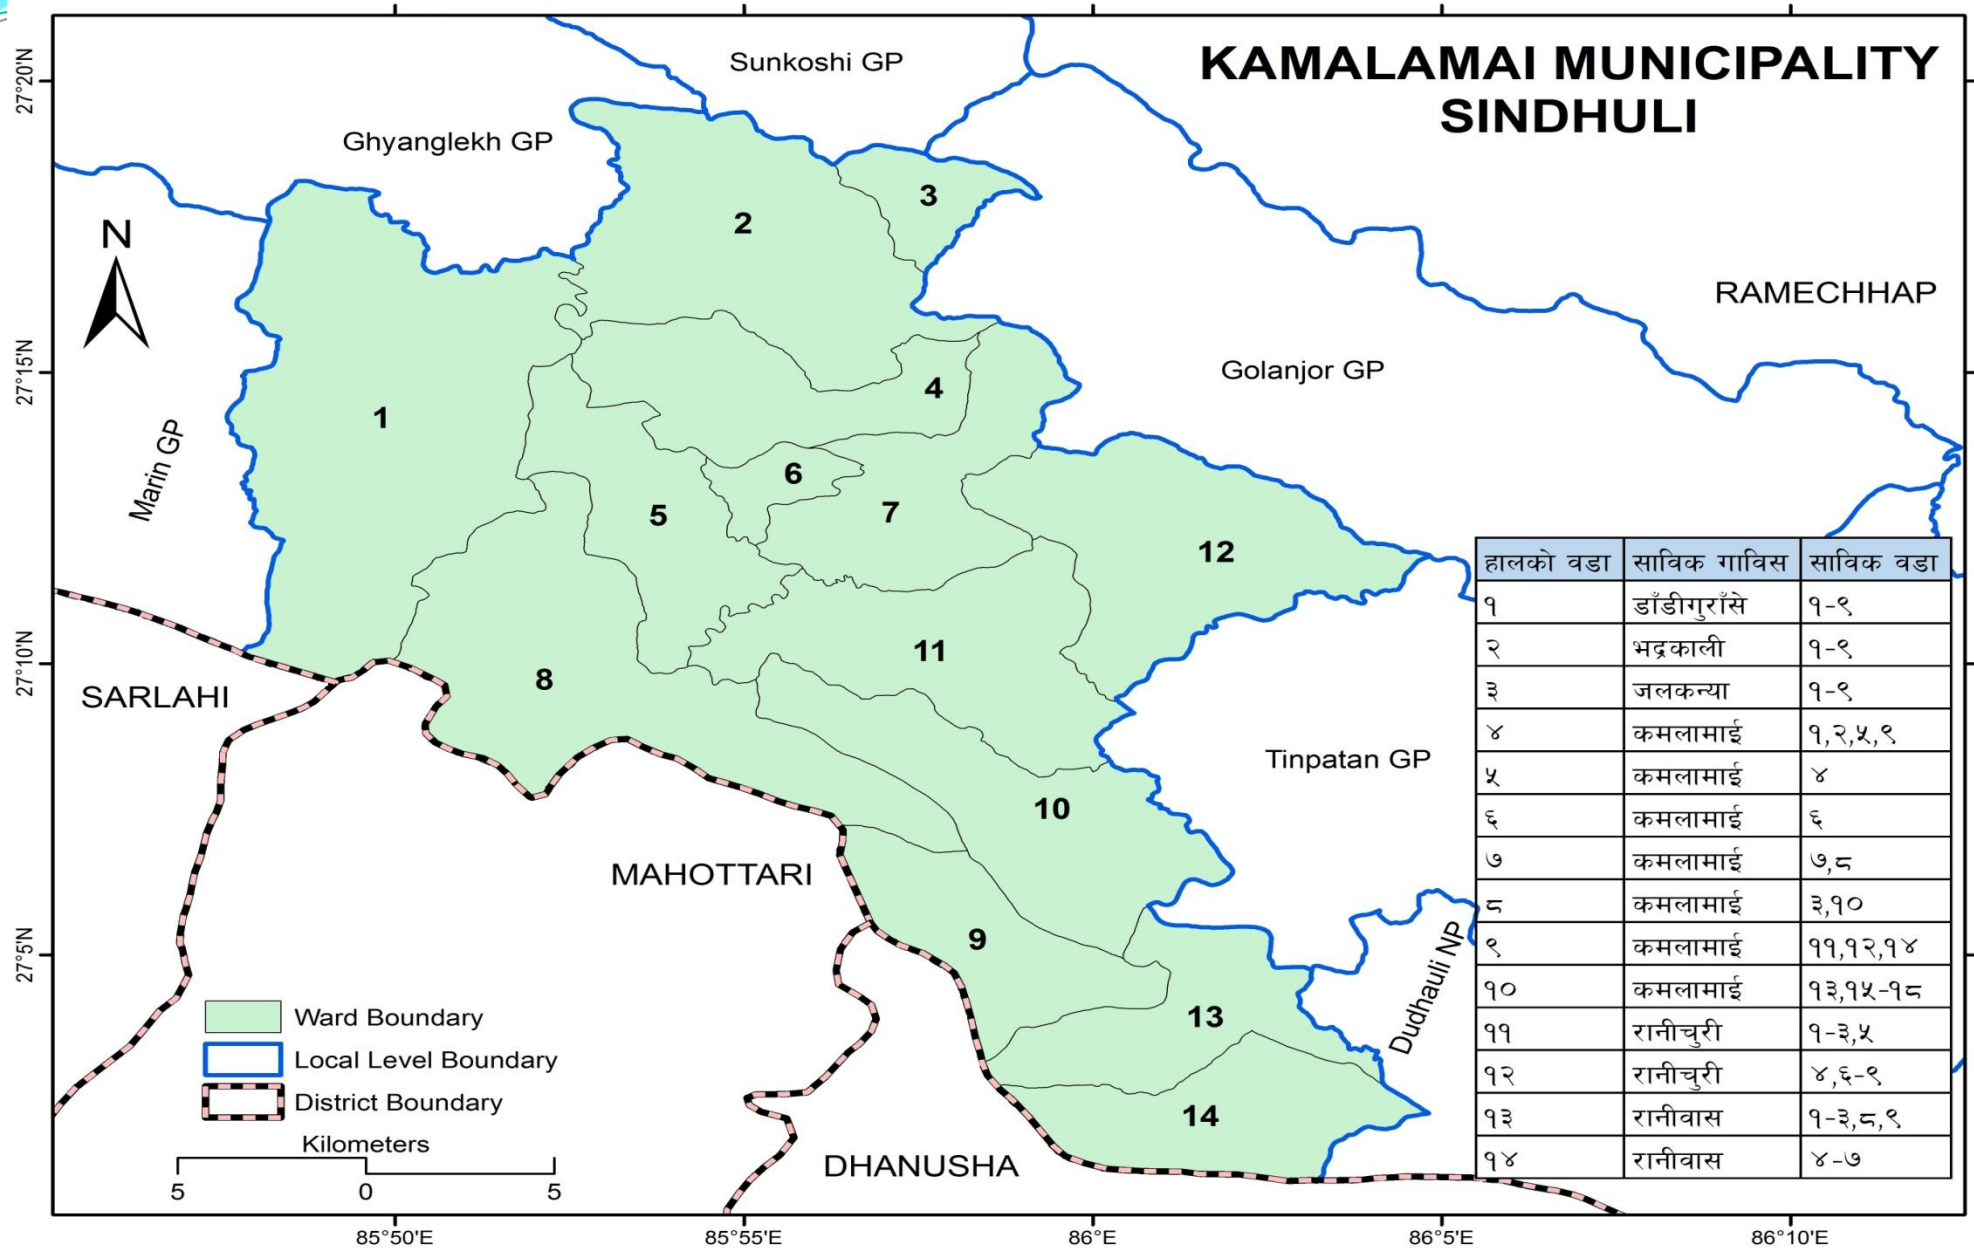

परिचय

कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली

स्थापना : २०५३

३ नं. प्रदेश, जनकपुर अञ्चल

क्षेत्रफल : ४८२.५७ वर्ग कि.मी.

वडा संख्या : १४

जनसंख्या विवरण

(सिन्धुलीका स्थानिय तह बस्तुगत विवरण, २०७४)

- कूल जनसंख्या : ६६,६३१
- घरधुरी संख्या : १५,६५९
- जनघनत्व : १५९ जना प्रति ब.कि.मी.
- साक्षरता प्रतिशत : ८६.६९ %
- पुरुष : ८२.५१ %
- महिला : ७५.५६ %

■ धर्म

हिन्दू : ७३.४३%

बौद्ध : २२.४९%

क्रिश्चियन : १.९३%

प्रकृति : १.५९%

नखुलेको : ०.४%

■ भाषा

नेपाली : ६५.३७%

तामाङ्ग : २०.२८%

मगर : ४.७९%

नेवार : २.८७%

दनुवार : १.९७%

■ जातजाति

तामाङ्ग : २१.९%

क्षेत्री : १९.८६%

मगर : ११.४५%

नेवार : १०.३%

ब्राम्हण : ९.७२%

वडागात प्रगति विवरण

२०७६।०७७

वडा नं. १

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	४४
कार्यपालिका निर्णयबाट	५
नगर प्रमुखको निर्णय	८
जम्मा योजना संख्या	५७
सम्झौता भएका योजना संख्या	५४
सम्झौता नभएका योजना संख्या	३
सम्पन्न योजना संख्या	५४
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	२४
खानेपानी	१४
सामुदायिक भवन	५
शिक्षा	५
सिचाई	५
प्रकोप	२
बिद्युत	१
विविध	१
जम्मा	५७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			६६,७१,१४१।२४	५३,२०,४३८।३८
कल्भर्ट	१.००	गोटा	२,५४,५६८।७२	२,००,०००।००
नाला	४२९.६०	मिटर	२३,१२,२३९।४१	१८,४८,९५३।०८
सोलिड्	२०.००	मिटर	३१,६११।८५	२५,२८९।००
ग्राभेल	१.०२	कि.मी.	१,४६,६१०।७०	१,१७,२८१।३६
पि.सि.सि.	३१.००	मिटर	३,७५,३६६।९१	३,००,०००।००
आर.सि.सि.	१५.५०	मिटर	१,४२,३२३।४७	१,००,०००।००
नयाँ ट्र्याक खोल्ने	४.३४	कि.मी.	२५,०७,१५८।६९	१९,९८,९११।६५
मर्मत	२.१५	कि.मी.	९,०१,२६१।४५	७,३१,००३।२७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			२१,८२,८९१।२४	१६,९४,९४६।००
ट्यांकी निर्माण	३	गोटा	७,३०,४७२।०८	५,७६,५४९।००
ट्यांकी मर्मत	२	गोटा	६,३०,३०४।१५	५,००,०००।००
पाइप	१४४०	मिटर	२,४२,२४६।२६	१,७९,३९७।००
इनार	५	गोटा	५,७९,८६८।७५	४,४०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१०,१२,५३८।३०	७,७५,०००।००
निर्माण	२	गोटा	२,०९,४८९।५५	१,७५,०००।००
मर्मत	३	गोटा	८,०३,०४८।७५	६,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			७,५६,९२९।३९	६,००,०००।००
मर्मत	१	गोटा	६२,७७०।९६	५०,०००।००
शौचालय	१	गोटा	१,८७,८९६।९१	१,५०,०००।००
मन्दिर/गुम्बा निर्माण	२	गोटा	४,४३,७२५।८६	३,५०,०००।००
मन्दिर मर्मत	१	गोटा	६२,५३५।६६	५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			३०,९७,११४।५७	२४,५०,०००।००
भवन मर्मत	२	गोटा	२६,५६,०२३।०८	२१,००,०००।००
कम्पाउण्डवाल	१	गोटा	१,२५,०४३।५९	१,००,०००।००
अन्य	२	गोटा	३,१५,०४७।९०	२,५०,०००।००

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
પ્રકોપ			૩,૯૫,૩૯૩।૨૦	૩,૦૦,૦૦૦।૦૦
તટબન્ધ	૨	ગોટા	૩,૯૫,૩૯૩।૨૦	૩,૦૦,૦૦૦।૦૦

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
વિવિધ			૧,૮૭,૮૨૪।૮૮	૧,૫૦,૦૦૦।૦૦
	૧	ગોટા	૧,૮૭,૮૨૪।૮૮	૧,૫૦,૦૦૦।૦૦

वडा नं. २

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३२
कार्यपालिका निर्णय	७
नगर प्रमुख निर्णय	९
प्रदेश	३
जम्मा योजना संख्या	५१
सम्झौता भएका योजना संख्या	४९
सम्झौता नभएका योजना संख्या	२
सम्पन्न योजना संख्या	४८
चालु योजना संख्या	१
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	३३
खानेपानी	३
सामुदायिक भवन	५
शिक्षा	१
सिचाई	७
बिद्युत	१
विविध	१
जम्मा	५१

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,१८,९३,०९७।००	९८,७४,८४७।००
कल्भर्ट	२।००	गोटा	१३,७५,०००।००	११,००,०००।००
नाला	१५.००	मिटर	२,५०,०००।००	२,००,०००।००
सोलिड्	३०६.००	मिटर	६,८७,०००।००	५,५०,०००।००
पि.सि.सि.	२९.००	मिटर	२,५०,०००।००	२,००,०००।००
नयाँ ट्रयाक खोल्ने	७.८७	कि.मी.	८४,९९,८४७।००	७१,४९,८४७।००
मर्मत	८.२७	कि.मी.	८,३१,२५०।००	६,६५,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			२१,८५,९५९।८४	१९,५८,९५९।८४
निर्माण	२	गोटा	१४,८४,४०७।८४	१४,८४,४०७।८४
मर्मत	१	गोटा	६८,५५२।००	६८,५५२।००
शौचालय	२	गोटा	६,४५,०००।००	५,२०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विद्युत			८,९८,६४५।००	४,४९,३२२।५०
लाइन विस्तार	१२ १००	कि.मी. पोल	८,९८,६४५।००	४,४९,३२२।५०

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			१८,७६,४४९।००	१५,००,०००।००
टचांकी निर्माण	२	गोटा	७,१९,३७५।००	५,७५,५००।००
टचांकी मर्मत	१	गोटा	४८,८५१।००	३९,०००।००
पाइप	६२८०	मिटर	११,०८,२२३।००	८,८५,५००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१३,७५,०००।००	११,००,०००।००
मर्मत	७	गोटा	१३,७५,०००।००	११,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			१,५१,८७५।००	१,२१,५००।००
अन्य	१।००	गोटा	१,५१,८७५।००	१,२१,५००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			१,२५,०००।००	१,००,०००।००
अन्य	१।००	गोटा	१,२५,०००।००	१,००,०००।००

वडा नं. ३

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३७
कार्यपालिका निर्णय	३
नगर प्रमुख निर्णय	१०
संघ / प्रदेश	१
जम्मा योजना संख्या	५१
सम्झौता भएका योजना संख्या	५०
सम्झौता नभएका योजना संख्या	१
सम्पन्न योजना संख्या	४७
चालु योजना संख्या	२
काम नभएको योजना संख्या	१

विवरण	संख्या
सडक	२६
सामुदायिक भवन	३
शिक्षा	३
सिचाई	९
विविध	१०
जम्मा	५१

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			९७,४९,५००।००	७८,२०,०००।००
पि.सि.सि.	३६५.००	मिटर	४३,७४,५००।००	३५,००,०००।००
आर.सि.सि.	५६.००	मिटर	७,५०,०००।००	६,००,०००।००
नयाँ ट्रचाक खोल्ने	२.१०	कि.मी.	२०,३७,५००।००	१६,५०,०००।००
मर्मत	५.४४	कि.मी.	२५,८७,५००।००	२०,७०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई कुलो			१२,३७,०००।००	१०,६०,०००।००
मर्मत	९	गोटा	१२,३७,०००।००	१०,६०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			१८,८६,५७६।४१	१५,९८,०७६।४१
निर्माण	१	गोटा	१७,७४,०७६।४१	१४,९९,०७६।४१
मर्मत	१	गोटा	१,९९,१३०।८०	१,९९,१३०।८०
मन्दिर	१	गोटा	१,१२,५००।००	९०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			४९,१२,९६३।००	४७,८७,९६३।००
कम्पाउण्डवाल	२।००	गोटा	६,२५,०००।००	५,००,०००।००
अन्य	१।००	गोटा	४२,८७,९६३।००	४२,८७,९६३।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			३५,०९,८५७।०८	३३,०९,८६१।०८
अन्य	९।००	गोटा	३५,०९,८५७।०८	३३,०९,८६१।०८

वडा नं. ४

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	४२
कार्यपालिका निर्णय	४
नगर प्रमुख निर्णय	१८
संघ/प्रदेश/सडक बोर्ड	७
जम्मा योजना संख्या	७१
सम्भौता भएका योजना संख्या	७१
सम्भौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	६९
चालु योजना संख्या	२
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	४१
खानेपानी	११
सामुदायिक भवन	१३
शिक्षा	४
प्रकोप	२
जम्मा	७१

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,२७,६४,१३०।३१	१,१२,३४,७४९।५२
कल्भर्ट	३.००	गोटा	३,७३,६३५।३८	३,००,०००।००
नाला	३२३.००	मिटर	१८,७५,०००।००	१५,००,०००।००
ग्राभेल	१.२५	कि.मी.	७,५०,०००।००	६,००,०००।००
पि.सि.सि.	९६.००	मिटर	१२,५०,८२०।२७	१०,००,०००।००
नयाँ ट्रचाक खोल्ने	२.११	कि.मी.	२०,९८,७०२।९५	१६,७५,०००।००
मर्मत	२.६५	कि.मी.	६४,१५,९७१।७२	६१,५९,७४९।५२

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			६७,९६,५१७।१७	५४,७१,०७३।००
निर्माण	७	गोटा	५१,४३,३१७।५५	४१,१४,६५४।००
प्रतिक्षालय मर्मत	१	गोटा	३,७५,८७६।८०	३,००,०००।००
मन्दिर मर्मत	१	गोटा	९७,४१९।५०	९७,४१९।००
शौचालय	३	गोटा	९,३८,३११।५५	७,५०,०००।००
अन्य	१	गोटा	२,४१,५९१।७७	२,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			३३,०३,३२४।९८	२७,००,०००।००
टचांकी निर्माण	४	गोटा	९,९६,४१०।४२	८,००,०००।००
पाइप	७५००।००	मिटर	६,४०,६२०।	५,१५,४९४।००
इनार	१०	गोटा	६,२५,०००।००	५,००,०००।००
धारा	१	गोटा	३,७५,०००।००	३,००,०००।००
अन्य	२	गोटा	६,६६,२९३।७६	५,८४,५०६।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			१६,८७,०८८।३६	१३,५०,०००।००
कम्पाउण्डवाल	४।००	गोटा	१६,८७,०८८।३६	१३,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप			१३,१३,३१९।८४	१०,५०,०००।००
पहिरो नियन्त्रण	२।००	गोटा	१३,१३,३१९।८४	१०,५०,०००।००

वडा नं. ५

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३९
कार्यपालिका निर्णय	७
नगर प्रमुख निर्णय	१४
संघ / प्रदेश	६
जम्मा योजना संख्या	६६
सम्झौता भएका योजना संख्या	६६
सम्झौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	६२
चालु योजना संख्या	४
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	५०
खानेपानी	६
सामुदायिक भवन	५
शिक्षा	१
प्रकोप	१
विविध	३
जम्मा	६६

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,६८,०५,४४१।८३	१,४४,६३,३२९।६१
कल्भर्ट	५	गोटा	१६,९६,६०८।५९	१३,००,०००।००
नाला	८५८.००	मिटर	२८,२५,८८५।२६	२३,५९,०००।००
ग्राभेल	०.५६	कि.मी.	३,०४,४०५।००	२,४२,५६०।००
पि.सि.सि.	२१३.००	मिटर	२३,४८,०८९।०३	१८,७८,४७१।२०
आर.सि.सि.	१४१.५०	मिटर	२०,३१,०३७।५७	१६,२०,०००।००
मर्मत	२.३८	कि.मी.	७५,९९,४१६।३८	७०,६३,२९८।४१

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			२२,१९,१२१।९८	१७,७१,९४२।८६
टचांकी मर्मत	१	गोटा	३,२७,२४७।९५	२,६१,७९८।३६
पाइप	२६२७	मिटर	५,१७,३२४।००	४,१३,८५९।३०
इनार	२०	गोटा	१०,०४,१९२।६१	८,००,०००।००
धारा	८	गोटा	३२,८५७।४२	२६,२८५।२०
अन्य	२	गोटा	३,३७,५००।००	२,७०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			६८,३७,५४९।२७	६९,७७,९५७।७०
निर्माण	२।००	गोटा	४८,२८,८३७।९०	४९,७७,९५७।७०
मर्मत	९।००	गोटा	६,२६,०९९।३७	५,००,०००।००
मन्दिर	९।००	गोटा	९२,५२,५३६।०५	९०,००,०००।००
शौचालय	९।००	गोटा	९,३०,९५६।७४	९,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			४,३९,२२८।६८	३,५०,०००।००
मर्मत	४।००	गोटा	४,३९,२२८।६८	३,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			९,२५,३०९।००	९,००,०००।००
अन्य	९।००	गोटा	९,२५,३०९।००	९,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप			१२,५३,३१९।८४	१०,००,०००।००
पहिरो नियन्त्रण	१।००	गोटा	१२,५३,३१९।८४	१०,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			१,८७,५१०।००	१,५०,०००।००
अन्य	२।००	गोटा	१,८७,५१०।००	१,५०,०००।००

वडा नं. ६

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	४१
कार्यपालिका निर्णय	८
नगर प्रमुख निर्णय	१०
संघ / प्रदेश	५
जम्मा योजना संख्या	६४
सम्झौता भएका योजना संख्या	६३
सम्झौता नभएका योजना संख्या	१
सम्पन्न योजना संख्या	६२
चालु योजना संख्या	१
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	२९
खानेपानी	१०
सामुदायिक भवन	१७
शिक्षा	५
विविध	३
जम्मा	६४

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,६१,८४,३१५।३०	१,३२,६९२७८।१९
कल्भर्ट	२	गोटा	९,७९,८६०।६६	७,८३,८९०।००
नाला	१२३३.८०	मिटर	७८,७३,२३६।८९	६१,५९,९४१।०५
ग्राभेल	१.१२	कि.मी.	६,००,३८६।७६	४,७५,०००।००
आर.सि.सि.	२३६.३०	मिटर	२६,३२,५५१।२१	२०,८६,०००।००
मर्मत	१.५७	कि.मी.	४०,९८,२७९।७८	३७,६४,४४७।१४

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			१,७०,८०,९३०।९७	१,५१,२९,७३४।९०
निर्माण	९	गोटा	१,०५,४७,३२८।१०	९८,१६,६११।८६
मर्मत	२	गोटा	११,६३,१२३।०४	११,६३१२३।०४
मन्दिर/गुम्बा	५	गोटा	४८,७०,४७९।८३	३७,५०,०००।००
अन्य	१	गोटा	५,००,०००।००	४,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			२३,३३,८४२।४८	१८,४९,०००।००
भवन निर्माण	१	गोटा	१२,७२,५९२।४८	१०,००,०००।००
भवन मर्मत	२	गोटा	३,११,२५०।००	२,४९,०००।००
अन्य	२।००	गोटा	७,५०,०००।००	६,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			१९,७६,४४०।५६	१५,६१,७९८।३६
टचांकी निर्माण	२	गोटा	४,५२,२४७।९५	३,६१,७९८।३६
इनार	२८	गोटा	१५,०४,१९२।६१	१२,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			१,५१,८६,०८५।९६	१,५१,८६,०८५।९६
अन्य	२।००	गोटा	१,५१,८६,०८५।९६	१,५१,८६,०८५।९६

वडा नं. ७

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३०
कार्यपालिका निर्णय	५
नगर प्रमुख निर्णय	१६
संघ / प्रदेश	६
जम्मा योजना संख्या	५७
सम्झौता भएका योजना संख्या	५७
सम्झौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	५५
चालु योजना संख्या	२
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	३६
खानेपानी	९
सामुदायिक भवन	५
शिक्षा	४
विद्युत	१
विविध	२
जम्मा	५७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,८८,९०,४६२।९७	१,५०,९२,०९९।५८
कल्भर्ट	५	गोटा	६,३६,८३३।६२	५,३०,०००।००
नाला	१००६	मिटर	४८,२६,०९६।८९	३७,००,९००।००
ग्राभेल	०.६६	कि.मी.	३,३५,६०६।२९	२,५०,०००।००
सोलिड्	२४२.२०	मिटर	३,१३,५९४।४०	२,२९,८००।००
आर.सि.सि.	२६५.९०	मिटर	२०,७३,८९१।१४	१६,०२,४००।००
नयाँ ट्रचाक खोल्ने	६.९६	कि.मी.	४४,८०,१९८।६३	४०,४०,२६३।३८
मर्मत	३.५६	कि.मी.	६२,२४,२४२।००	४७,३८,७३६।२०

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			१५,०४,३५७।९४	१२,००,०००।००
टचांकी निर्माण	३	गोटा	४,३८,४९०।२९	३,५०,०००।००
टचांकी मर्मत	१	गोटा	२,५१,११२।११	२,००,०००।००
पाइप	२६३०	मिटर	५,००,०००।००	४,००,०००।००
इनार	२	गोटा	२,२६,५०५।०५	१,८०,०००।००
अन्य	१	गोटा	८८,२५०।४९	७०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			१५,१९,०८६।६३	१२,००,०००।००
निर्माण	२	गोटा	८,९१,९९८।७५	७,००,०००।००
गुम्बा मर्मत	२	गोटा	३,७४,५२५।९०	३।००,०००।००
अन्य	१	गोटा	२,५०,५६१।९८	२,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			२८,२६,४६१।८५	२१,५०,०००।००
कम्पाउण्डवाल	३	गोटा	२६,३७,८५९।६७	२०,००,०००।००
अन्य	१	गोटा	१,८८,६०२।१८	१,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विद्युत			३६,८९,३३५।४८	१८,४४,६६७।७४
मुख्य लाइन	७.५० र १२५	कि.मी. र पोल	१२,३२,१४७।९८	१८,४४,६६७।७४
शाखा लाइन	३०.० र २५०	कि.मी. र पोल	२४,५७,१८७।५०	

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			२१,४५,७७६।८९	१७,००,०००।००
अन्य	२	गोटा	२१,४५,७७६।८९	१७,००,०००।००

वडा नं. ८

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३६
कार्यपालिका निर्णय	६
नगर प्रमुख निर्णय	६
संघ / प्रदेश	०
जम्मा योजना संख्या	४८
सम्झौता भएका योजना संख्या	४८
सम्झौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	४४
चालु योजना संख्या	४
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	२३
खानेपानी	८
सामुदायिक भवन	७
शिक्षा	२
विद्युत	२
सिंचाई	२
प्रकोप	२
विविध	२
जम्मा	४८

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,१२,२४,२९३।२१	९१,१९,६२८।१९
कल्भर्ट	६	गोटा	९,४६,१६४।५६	७,४०,०००।००
नाला	५१६.००	मिटर	३९,१३,४४८।०५	२९,२८,०००।००
सोलिड्	१७५.००	मिटर	२,२१,३२०।००	१,७७,०००।००
ग्राभेल	०.५०	मिटर	२,००,०००।००	१,६०,०००।००
आर.सि.सि	१०४.५५	मिटर	१३,२३,३७७।९८	१०,२५,०००।००
ट्रचाक खोल्ने कार्य	५.००	कि.मी.	१०,४५,०००।००	८,३६,०००।००
मर्मत	०.९३	कि.मी.	३५,७२,९८२।६२	३२,५३,६२८।१९

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			१७,९५,६०८।७८	१४,३२,४००।००
टचांकी निर्माण	१	गोटा	२,५१,०६५।२८	२,००,०००।००
टचांकी मर्मत	४	गोटा	८,१६,५४०।५०	६,५०,०००।००
पाइप	१५५०	मिटर	२,०८,०००।००	१,६६,४००।००
इनार	१	गोटा	१,४५,०००।००	१,१६,०००।००
अन्य	१।००	गोटा	३,७५,०००।००	३,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			३४,६८,४९५।८०	२९,९६,७१६।१०
निर्माण	२	गोटा	१५,९०,८८३।१६	१४,९६,७१६।१०
मर्मत	१	गोटा	३,७५,०००।००	३,००,०००।००
मन्दिर	१	गोटा	३,७५,०००।००	३,००,०००।००
शौचालय	३	गोटा	११,२७,६१२।६४	९,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			१०,००,१०१।५१	८,००,०००।००
भवन मर्मत	१	गोटा	२,५०,१०१।५१	२,००,०००।००
कम्पाउण्डवाल	१	गोटा	७,५०,०००।००	६,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विद्युत			६४,७०,८५८।१६	३२,००,०००।००
मुख्य लाइन	२३.० र २३५	कि.मी. र पोल	३१,४९,६१३।१६	३२,००,०००।००
शाखा लाइन	३२.० र ४११	कि.मी. र पोल	३३,२१,२४५।००	

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
સિંચાઈ			૭,૫૦,૦૦૦ ૦૦	૬,૦૦,૦૦૦ ૦૦
નિર્માણ	૨	ગોટા	૭,૫૦,૦૦૦ ૦૦	૬,૦૦,૦૦૦ ૦૦

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
પ્રકોપ			૮,૭૫,૦૦૦ ૦૦	૭,૦૦,૦૦૦ ૦૦
તટબન્ધ	૨	ગોટા	૮,૭૫,૦૦૦ ૦૦	૭,૦૦,૦૦૦ ૦૦

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
અન્ય			૮,૨૨,૮૮૫ ૫૪	૭,૦૦,૦૦૦ ૦૦
વિવિધ	૧	ગોટા	૮,૨૨,૮૮૫ ૫૪	૭,૦૦,૦૦૦ ૦૦

वडा नं. ९

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	२९
कार्यपालिका निर्णय	३
नगर प्रमुख निर्णय	१७
संघ / प्रदेश	५
जम्मा योजना संख्या	५४
सम्झौता भएका योजना संख्या	५४
सम्झौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	५१
चालु योजना संख्या	२
काम नभएको योजना संख्या	१

विवरण	संख्या
सडक	३१
खानेपानी	६
सामुदायिक भवन	८
सिंचाई	३
प्रकोप	२
विविध	४
जम्मा	५४

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,०९,७१,८६१।४३	९०,१५,७५८।२५
कल्भर्ट	१	गोटा	२,५१,६७९।८७	२,००,०००।००
नाला	१९४.५०	मिटर	१३,८१,२३०।०९	११,००,०००।००
पि.सि.सि.	६२.६०	मिटर	६,५४,२४९।८८	५,२३,३९९।९०
आर.सि.सि.	२८.२०	मिटर	६,६४,०९५।३२	५,३१,२७६।२६
नयाँ ट्र्याक खोल्ने	०.१८	कि.मी.	५,६३,१४३।००	४,५०,०००।००
मर्मत	३.६४	कि.मी.	७४,५८,४६३।२७	६२,११,०८३।०९

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			४४,५९,३५६।१५	३५,६३,५४८।९०
पाइप	८२३५	मिटर	२९,६४,६१२।९०	२३,८२,४७४।३०
धारा	२५०	गोटा	८,७६,३४३।२५	७,०१,०७४।६०
इनार	९	गोटा	६,१८,४००।००	४,८०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			८,८८,६५०।०१	७,००,०००।००
मर्मत	३	गोटा	८,८८,६५०।०१	७,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन				
निर्माण	२	गोटा	५,६६,६९४।९२	४,५०,०००।००
मर्मत	१	गोटा	१,२८,१३५।००	१,००,०००।००
प्रतिक्षालय	१	गोटा	२,४५,३७६।००	२,००,०००।००
शौचालय	३	गोटा	१४,४२,९२९।५७	११,५०,०००।००
अन्य	१	गोटा	७,५२,९४२।२७	६,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा				
भवन निर्माण		गोटा	२,६७,०६३।९२	२,६७,०६३।९२

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप				
पहिरो नियन्त्रण	२	गोटा	५,२२,९४७।८०	४,२०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध				
अन्य	४	गोटा	९,३५,५२५।८०	८,००,०००।००

वडा नं. १०

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	४८
कार्यपालिका निर्णय	४
नगर प्रमुख निर्णय	११
संघ / प्रदेश	४
जम्मा योजना संख्या	६७
सम्झौता भएका योजना संख्या	६६
सम्झौता नभएका योजना संख्या	१
सम्पन्न योजना संख्या	६३
चालु योजना संख्या	२
काम नभएको योजना संख्या	१

विवरण	संख्या
सडक	३४
खानेपानी	७
सामुदायिक भवन	६
शिक्षा	६
विद्युत	१
सिंचाई	१०
प्रकोप	१
विविध	२
जम्मा	६७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,३१,००,०१९।०७	१,१४,४९,३७२।७१
नाला	१२९.४०	मिटर	१३,७१,१९७।४३	१०,८०,०००।००
सोलिड्	४३.५५	मिटर	६३,२३७।४४	५०,०००।००
पि.सि.सि.	६०.८०	मिटर	४,६८,८८३।२५	३,७५,०००।००
नयाँ ट्र्याक निर्माण	१.८७	कि.मी.	६,८८,५४३।२५	५,५०,०००।००
मर्मत	९.०६	कि.मी.	१०५०८१५८।७०	९३,९४,३६२।६१

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			२३,४२,७३३।६९	१८,७५,०००।००
निर्माण	२	गोटा	१६,८७,५००।००	१३,५०,०००।००
मर्मत	३	गोटा	४,६६,२९६।१२	३,७५,०००।००
प्रतिक्षलय	१	गोटा	१,८८,९३७।५७	१,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			२५,५२,७८५।७५	२१,००,०००।००
भवन मर्मत	१	गोटा	१,२५,७९०।८३	१,००,०००।००
कम्पाउण्डवाल	५	गोटा	२४,२६,९९४।९२	२०,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			१४,०१,७६६।३६	११,२०,०००।००
टचांकी निर्माण	१	गोटा	२,४५,५००।००	१,९६,४००।००
टचांकी मर्मत	१	गोटा	१,२५,४६५।८१	१,००,०००।००
पाइप	७०००	मिटर	४,२५,१४०।५४	३,३९,५००।००
इनार	२	गोटा	१,५०,१६०।०१	१,२०,०००।००
अन्य	१	गोटा	४,५५,५००।००	३,६४,१००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१३,१६,८९२।४४	१०,५०,०००।००
मर्मत	१०	गोटा	१३,१६,८९२।४४	१०,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विद्युत			३०,०१,०९२।५९	१५,००,०००।००
मुख्य लाइन	७.०० र ७७	कि.मी. र पोल	१०,४४,६६०।०९	१५,००,०००।००
शाखा लाइन	२१.० र २००	कि.मी. र पोल	१९,५६,४३२।५०	

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप			१,२६,०४५।४०	१,००,०००।००
तटबन्ध	१	गोटा	१,२६,०४५।४०	१,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			१,००,०००।००	१,००,०००।००
अन्य	१	गोटा	१,००,०००।००	१,००,०००।००



वडा नं. ११

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३९
कार्यपालिका निर्णय	८
नगर प्रमुख निर्णय	८
संघ / प्रदेश	३
जम्मा योजना संख्या	५८
सम्झौता भएका योजना संख्या	५८
सम्झौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	५७
चालु योजना संख्या	१
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	२४
खानेपानी	७
सामुदायिक भवन	८
शिक्षा	१
सिंचाई	१६
विविध	२
जम्मा	५८

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
સડક			૧,૪૬,૪૬,૩૩૨।૭૫	૧,૧૩,૮૮,૦૦૦।૦૦
કલ્મર્ટ	૫	ગોટા	૩૮,૮૬,૮૧૮।૧૬	૨૯,૮૮,૦૦૦।૦૦
નાલા	૨૬૨.૪૦	મિટર	૧૯,૬૯,૪૪૪।૪૪	૧૫,૩૦,૦૦૦।૦૦
સોલિડ્	૩૫૩.૦૦	મિટર	૫,૮૫,૦૦૦।૦૦	૪,૬૮,૦૦૦।૦૦
ગ્રાભેલ	૦.૫૩	કિ.મી.	૨,૧૨,૩૫૬।૦૦	૧,૬૫,૦૦૦।૦૦
પિ.સિ.સિ.	૨૭.૦૦	મિટર	૩,૭૫,૦૦૦।૭૫	૩,૦૦,૦૦૦।૦૦
આર.સિ.સિ.	૬.૦૦	મિટર	૧,૦૦,૨૩૨।૨૩	૮૦,૦૦૦।૦૦
ટ્રચાક ખોલ્ને કાર્ય	૮.૫૫	કિ.મી.	૨૦,૯૭,૯૪૮।૫૫	૧૫,૬૧,૦૦૦।૦૦
મર્મત	૪.૧૯	કિ.મી.	૫૪,૧૯,૫૩૨।૬૨	૪૨,૯૭,૦૦૦।૦૦

યોજના શિર્ષક	પ્રગતિ	ઇકાઈ	લાગત રૂ.	અનુદાન રૂ.
ભવન			૫૭,૨૪,૦૪૩।૪૧	૫૩,૯૨,૩૧૩।૬૮
નિર્માણ	૩	ગોટા	૪૫,૪૨,૩૧૩।૬૫	૪૪,૪૨,૩૧૩।૬૮
મન્દિર/ગુમ્બા	૩	ગોટા	૩,૭૯,૨૨૯।૭૬	૩,૦૦,૦૦૦।૦૦
અન્ય	૨	ગોટા	૮,૧૨,૫૦૦।૦૦	૬,૫૦,૦૦૦।૦૦

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			६,५२,५७२।७२	५,५०,०००।००
टचांकी निर्माण	१	गोटा	३,७६,९७५।१९	३,००,०००।००
इनार	२	गोटा	२,७५,५९७।५३	२,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१८,३७,९७३।८४	१४,९६,२००।००
मर्मत	१२	गोटा	१५,८२,७४०।०५	१३,००,०००।००
अन्य	४	गोटा	२,५५,२३३।७९	१९६,२००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			१,८७,५००।००	१,५०,०००।००
भवन मर्मत	१	गोटा	१,८७,५००।००	१,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध			२,४९,५००।२७	१,९९,२००।००
अन्य	२	गोटा	२,४९,५००।२७	१,९९,२००।००

वडा नं. १२

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	४४
कार्यपालिका निर्णय	४
नगर प्रमुख निर्णय	७
संघ / प्रदेश	१
जम्मा योजना संख्या	५६
सम्भौता भएका योजना संख्या	५६
सम्भौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	५५
चालु योजना संख्या	१
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	१७
खानेपानी	२
सामुदायिक भवन	३
शिक्षा	५
सिंचाई	१४
विद्युत	१
विविध	१४
जम्मा	५६

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१,१९,७४,७१०।१८	८९,५९,७८१।००
कल्भर्ट	१	गोटा	१,८६,२०१।२०	१,४०,०००।००
नाला	१२१.००	मिटर	८,५३,१०३।९७	३,१४,०००।००
सोलिड्	११६.००	मिटर	१,७२,८०४।०८	१,३७,०००।००
ग्राभेल	०.१६	कि.मी.	१,६४,०१२।३१	१,३०,०००।००
ट्रचाक खोलने कार्य	६.९३	कि.मी.	४८,११,९५२।९६	३७,६६,०००।००
मर्मत	२२.३७	कि.मी.	५७,८६,६३५।७७	४४,७२,७८१।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			१९,७८,५००।००	१६,००,०००।००
भवन मर्मत	२	गोटा	८,५१,५००।००	७,००,०००।००
कम्पाउण्डवाल	३	गोटा	११,२७,०००।००	९,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१९,४६,०००।००	१५,५०,०००।००
निर्माण	१	गोटा	१,२६,०००।००	१,००,०००।००
मर्मत	१३	गोटा	१८,२०,०००।००	१४,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विद्युत			३,००,४३५।००	१,५०,०००।००
लाइन विस्तार	४ ३०	कि.मी. पोल	३,००,४३५।००	१,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी				
टचांकी निर्माण	१	गोटा	३,७६,९७५।१९	३,००,०००।००
पाइप	७००	मिटर	१,२७,०००।००	१,००,०००।००
इनार	३	गोटा	४,०२,५९७।५३	२,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन				
निर्माण		गोटा	१५,२०,५०६।८३	१५,२०,५०६।८३
मर्मत	१	गोटा	२,२६,५००।००	२,००,०००।००
कम्पाउण्डवाल	२	गोटा	३,७७,०००।००	३,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विविध				
अन्य	१४	गोटा	२,६७,०००।००	२,६७,०००।००

वडा नं. १३

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	३४
कार्यपालिका निर्णय	३
नगर प्रमुख निर्णय	६
संघ / प्रदेश	२
जम्मा योजना संख्या	४५
सम्झौता भएका योजना संख्या	४४
सम्झौता नभएका योजना संख्या	१
सम्पन्न योजना संख्या	४३
चालु योजना संख्या	१
काम नभएको योजना संख्या	०

विवरण	संख्या
सडक	२१
खानेपानी	६
सामुदायिक भवन	७
शिक्षा	६
सिंचाई	४
प्रकोप	१
जम्मा	४५

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			६७,८१,२७४।४२	५४,२३,२३५।००
नाला	३१६.००	मिटर	१५,२२,६५३।४८	१२,१८,६५३।४८
पि.सि.सि.	९१.००	मिटर	५,८५,८७७।३७	४,६८,७०१।९०
आर.सि.सि.	२८.१०	मिटर	७,५२,८९४।३९	६,००,०००।००
कालोपत्रे	३३.५०	मिटर	२,५०,०००।००	२,००,०००।००
ट्रचाक खोलने कार्य	२.००	कि.मी.	१४,९३,२०६।३५	११,९४,५६५।०८
मर्मत	१.६६	कि.मी.	२१,७६,६४२।८३	१७,४१,३१४।५६

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			२३,१३,३५३.१५	१८,५०,२८४।९०
टचांकी निर्माण	१	गोटा	१,२५,०००।००	१,००,०००।००
पाइप	२७००	मिटर	९,६१,७८६।९०	७,६९,४२९।५०
इनार	२	गोटा	३,१२,९९७।००	२,५०,०००।००
अन्य	१	गोटा	९,१३,५६९।२५	७,३०,८५५।४०

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१८,७९,८९४।००	१५,०४,८९४।००
मर्मत	४	गोटा	१८,७९,८९४।००	१५,०४,८९४।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			४०,१५,३९६।१६	३२,५९,५४०।७
निर्माण	१	गोटा	१८,७९,६६२।१३	१६,६९,५४०।७०
मर्मत	३	गोटा	३,६२,९२५।०६	२,९०,०००।००
प्रतिक्षालय	१	गोटा	५,०७,६७३।५०	४,००,०००।००
मन्दिर मर्मत	१	गोटा	३,७७,३४३।१६	२,००,०००।००
अन्य	१	गोटा	८,८७,७९२।३१	७,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			११,२९,१३०।१६	९,००,०००।००
भवन मर्मत	१	गोटा	५,०४,१३०।१६	४,००,०००।००
कम्पाउण्डवाल	२	गोटा	२,५०,०००।००	२,००,०००।००
अन्य	३	गोटा	३,७५,०००।००	३,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप			६,२८,७८१।५२	५,००,०००।००
तटबन्ध	१	गोटा	६,२८,७८१।५२	५,००,०००।००

वडा नं. १४

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	२१
कार्यपालिका निर्णय	२
नगर प्रमुख निर्णय	३
संघ / प्रदेश	१
जम्मा योजना संख्या	२७
सम्झौता भएका योजना संख्या	२७
सम्झौता नभएका योजना संख्या	०
सम्पन्न योजना संख्या	२५
चालु योजना संख्या	०
काम नभएको योजना संख्या	२

विवरण	संख्या
सडक	१५
खानेपानी	५
सामुदायिक भवन	३
शिक्षा	१
सिंचाई	२
प्रकोप	१
जम्मा	२७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			७०,७७,३९९।७५	५६,६०,००९।३६
कल्भर्ट	१	गोटा	६,२६,३३०।७७	५,००,०००।००
नाला	१४४५.५०	मिटर	४१,६१,७४४।८२	३३,२९,३९५।८६
ग्राभेल	१.३९	कि.मी.	४,८७,४०४।००	३,८९,९२३।२०
मर्मत	०.८९	कि.मी.	१८,०१,९२०।१६	१४,४०,६९०।३०

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			२९,९५,५१६।५५	२३,९५,५७४।४७
ट्यांकी मर्मत	१	गोटा	६,२६,०४८।२४	५,००,०००।००
इनार	३	गोटा	८,७६,२११।१०	७,००,९६८।७०
अन्य	२	गोटा	१४,९३,२५७।२१	११,९४,६०५।७७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			७,०९,७०६।४८	५,६७,७६५।१८
भवन मर्मत	१।००	गोटा	७,०९,७०६।४८	५,६७,७६५।१८

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			१५,१९,८७०।३४	१२,७१,३३१।४७
मर्मत	१	गोटा	४,७१,३३१।४७	४,७१,३३१।४७
मन्दिर	१	गोटा	३,७५,६१९।०८	३,००,०००।००
अन्य	१	गोटा	६,७३,०१९।७९	५,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई कुलो			११,३१,४१२।०५	९,००,०००।००
निर्माण	१	गोटा	३,७६,८६८।४८	३,००,०००।००
मर्मत	१	गोटा	७,५४,५४३।५७	६,००,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप			३,७९,७६४।१५	३,००,०००।००
तटबन्ध	१।००	गोटा	३,७९,७६४।१५	३,००,०००।००

समग्र प्रगति विवरण

२०७६।०७७

विवरण	संख्या
वडागत योजना संख्या	५१६
कार्यपालिका निर्णय	६९
नगर प्रमुख निर्णय	१४३
संघ/प्रदेश/सडक बोर्ड	४४
जम्मा योजना संख्या	७७२
सम्भौता भएका योजना संख्या	७६३
सम्भौता नभएका योजना संख्या	९
सम्पन्न योजना संख्या	७३५
चालु योजना संख्या	२३
काम नभएको योजना संख्या	५

विवरण	संख्या
सडक	४०४
खानेपानी	९४
सामुदायिक भवन	९५
शिक्षा	४४
विद्युत	७
सिंचाई	७२
प्रकोप	१२
विविध	४४
जम्मा	७७२

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सडक			१६,४७,७०,५३७।११	१३,५१,२०,०१२।१९
कल्भर्ट	३२	गोटा	१,१२,१३,७०१।५३	८७,८१,८९०।००
नाला	६.८५	कि.मी.	३,०९,७३,५३२।०८	२,४१,२१,४४९।१५
सोलिड्	१.०८	कि.मी.	२०,७४,५६८।२३	१६,९९,६५२।००
ग्राभेल	७.१९	कि.मी.	३२,००,७८१।२४	२५,२९,७६६।८१
पि.सि.सि.	९७५.४०	मिटर	१,०६,८२,७८४।२९	८५,०२,३५७।४०
आर.सि.सि	८८२।०५	मिटर	१,०४,७०,४०२।७४	८३,१०,२१८।१०
कालोपत्रे	३३.५०	मिटर	२,५०,०००।००	२,००,०००।००
नयाँ ट्र्याक खोल्ने	४७.९१	कि.मी.	३,०३,२३,१९९।६३	२,४८,७१,५८६।६५
मर्मत	६८.२२	कि.मी.	६,५५,८१,५६७।३८	५,६१,०३,०९२।०८

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
खानेपानी			२,९०,०७,२२९।५३	२,२०,३९,४७०।५९
टचांकी निर्माण	१९	गोटा	४७,१२,५११।४०	३८,३७,२२२।५५
टचांकी मर्मत	११	गोटा	३२,६५,४७०।९६	२२,५०,७९८।२७
पाइप	४०६६२	मिटर	८६,९४,९५३।६०	६१,२२,०५४।१०
इनार	८७	गोटा	६७,२०,७२२।१९	५२,८७,९६८।७०
धारा	२५९	गोटा	१२,८४,२००।६७	१०,२७,३५९।८०
अन्य	१०	गोटा	४३,२९,३७०।७१	३५,१४,०६७।१७

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
सिंचाई			१,३८,१४,५८९।६२	१,०९,७३,३४८।००
निर्माण	६	गोटा	१४,६२,३५८।०३	११,७५,०००।००
मर्मत	६७	गोटा	१,२०,९६,९९७।८०	९६,०२,१४८।००
अन्य	४	गोटा	२,५५,२३३।७९	१,९६,२००।००


योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
भवन			६,०१,२८,३१८।४०	५,१६,१२,५४१।४३
निर्माण	३३	गोटा	३,६७,५७,५२३।८९	३,३१,२०,९८५।१२
मर्मत	१६	गोटा	४१,४९,७८३।४७	३७,१७,१३७।३१
धर्मिक भवन	२०	गोटा	८९,३६,८३६।४२	६६,०४,४१९।००
शौचालय	१३	गोटा	४४,७०,९०६।५१	३५,७०,०००।००
कम्पाउण्डवाल	२	गोटा	३,७७,०००।००	३,००,०००।००
प्रतिक्षलय	४	गोटा	१३,१७,८६२।३८	१०,५०,०००।००
अन्य	८	गोटा	४१,१८,४०५।७३	३२,५०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
शिक्षा			२,४७,३७,००५।८७	२,१५,९६,८६३।००
भवन निर्माण	१	गोटा	३९,४३,२२८।४०	३६,७०,६३४।८२
भवन मर्मत	९	गोटा	४९,७१,००१।९०	४४,६६,७६५।१८
कम्पाउण्डवाल	२०	गोटा	९६,२८,९८६।५७	७६,५०,०००।००
अन्य	११	गोटा	६१,९३,७८९।००	५८,०९,४६३।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
प्रकोप			५४,९४,५७१।७५	४३,७०,०००।००
तटबन्ध	७	गोटा	२४,०४,९८४।२७	१९,००,०००।००
पहिरो नियन्त्रण	५	गोटा	३०,८९,५८७।४८	२४,७०,०००।००

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
विद्युत			१,४३,६०,३६६।२३	७१,४३,९९०।२४
मुख्य लाइन	३७.५०	कि.मी.	५४,२६,४२१।२३	७१,४३,९९०।२४
	४३७	गोटा		
शाखा लाइन	९९.००	कि.मी.	८९,३३,९४५।००	
	९९१.००	गोटा		

योजना शिर्षक	प्रगति	इकाई	लागत रु.	अनुदान रु.
अन्य			१,२१,८६,५७८।४२	१,११,३१,७५९।०४
विविध	३९	गोटा	१,२१,८६,५७८।४२	१,११,३१,७५९।०४

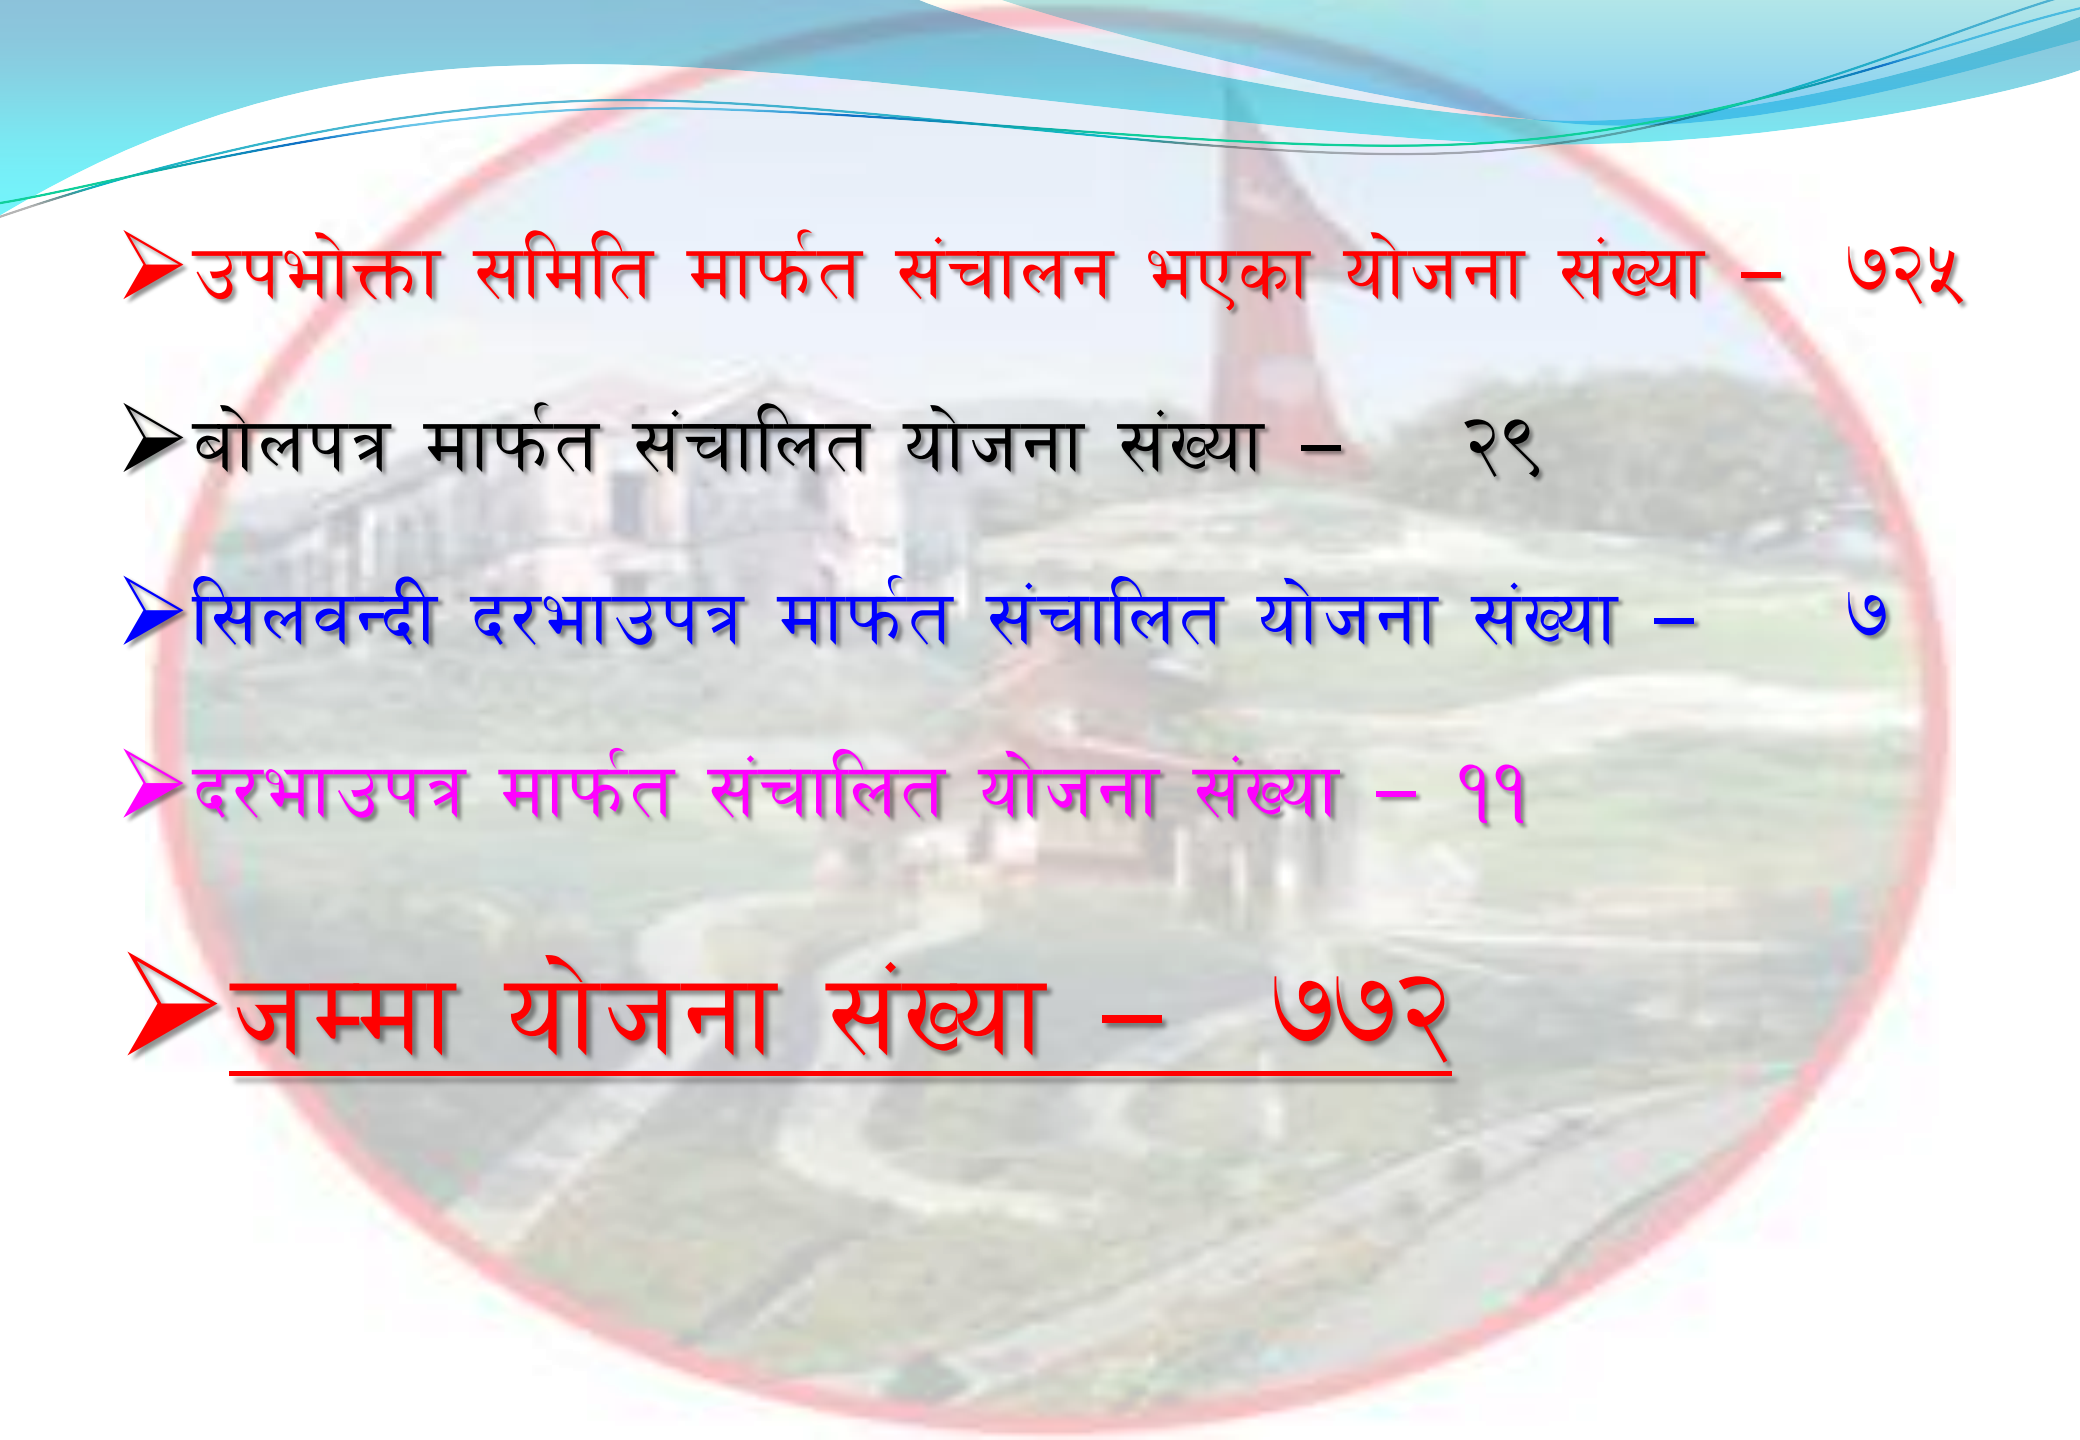- 
- उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका योजना संख्या – ७२५
 - बोलपत्र मार्फत संचालित योजना संख्या – २९
 - सिलवन्दी दरभाउपत्र मार्फत संचालित योजना संख्या – ७
 - दरभाउपत्र मार्फत संचालित योजना संख्या – ११
 - जम्मा योजना संख्या – ७७२
